

【様式 1-1】

# 美唄市 橋梁長寿命化修繕計画

平成 2 5 年 3 月

(平成 2 9 年 1 月 様式 1-2 改定)

(平成 3 0 年 1 月 改訂)

(令和 2 年 7 月 様式 1-1、様式 1-2 改定)

(令和 4 年 9 月 様式 1-1、様式 1-2 改訂)

美唄市都市整備課

# 1. 長寿命化修繕計画の背景と目的

## 1) 背景

美咲市が管理する道路橋は現在 256 橋あり、このうち建設後 50 年を経過する高齡化橋梁は、28 橋で 11%を占めていますが、20 年後には 169 橋で 66%となり、急速に高齡化が進んでいきます。

今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮減への取り組みが不可欠となります。

## 2) 目的


定期点検による橋梁の状態把握、予防的な修繕および計画的な架替えを着実に進め、橋梁の長寿命化と橋梁の修繕・架替えに係る費用を縮減します。

重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために長寿命化修繕計画を策定します。

【建設後 50 年以上の橋梁数の増加】



【橋種別の橋梁数】

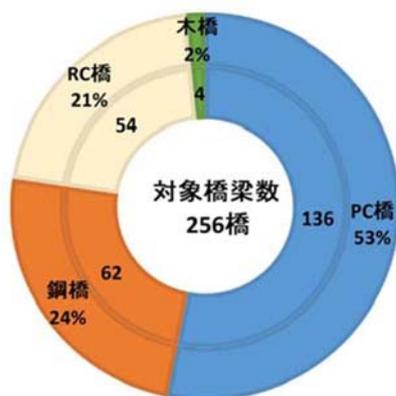

※RC 橋はボックスカルバート(45 橋)を含む。



10 線橋(橋長 114.9m)  
昭和 43 年供用開始(48 歳)

## 2. 対象橋梁

		管理区分 A	管理区分 B	管理区分 C	合計
全管理橋梁数		68	59	129	256
	うち計画の対象橋梁数	68	59	129	256
	うちこれまでの計画策定橋梁数	70	61	137	268
	うちR元年度計画策定橋梁数	68	59	129	256

管理区分	内 容
A	緊急輸送道路、第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁、橋長100m以上、1級道路、DID地区に架かる橋梁、塩害地域
B	A以外の橋長15m以上の橋梁
C	A、B以外の橋長15m未満の橋梁、第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁以外の自転車道

## 3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

### 1) 健全度把握の基本的な方針

点検マニュアルに基づき、専門家による橋梁点検を実施し、橋梁の健全度（損傷の程度）を把握します。

橋梁点検はおおよそ5年ごとに行っていく予定です。


それぞれの橋梁において、点検により把握した健全度に基づき、最適な修繕計画（低コストかつ長寿命化を図る計画）を立案します。

全対象橋梁において、長寿命化修繕計画を策定し、計画に基づいて順次、修繕を実施します。

点検および修繕した結果は、橋梁台帳および点検調書に記入し電子データとして保存します。

### 2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を良好な状態に保つために日常的な維持管理として、道路パトロール、清掃、応急措置等を実施し橋梁の異常や劣化進行要因の早期発見、安全な道路交通の確保、第三者に対する被害防止を図り、効率的・効果的な橋梁の長寿命化を推進します。

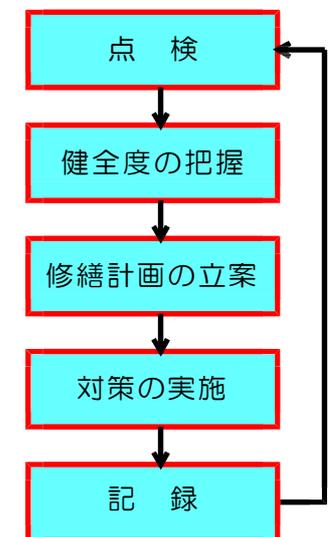

橋梁の維持管理の流れ

#### 4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

##### 1) 長寿命化による費用の縮減

健全度把握および日常的な維持管理に関する基本方針に基づき、予防保全的な維持管理・修繕計画を実施し、修繕や架替えに必要となる事業費の肥大化や無駄を排除し、ライフサイクルコスト(LCC)の縮減を図ります。

##### 2) 長寿命化修繕計画の見直し

詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握および損傷状況を踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行います。

※対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧による。

##### 3) 補修優先順位

第三者被害、重要路線、交通量などを考慮し、重要度の高い橋梁を優先的に修繕を実施します。


#### 5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式1-2による

#### 6. 長寿命化修繕計画による効果

今後60年の修繕・架替え事業費を試算した結果、予防保全型（損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う）の累計は約150億円、大規模補修・更新型（できる限り使用し、寿命段階で対策を行う）の累計は約400億円となり、予防保全型の維持修繕を実施することにより約250億円のコスト縮減が期待できます。

#### 保全・更新費用の推移

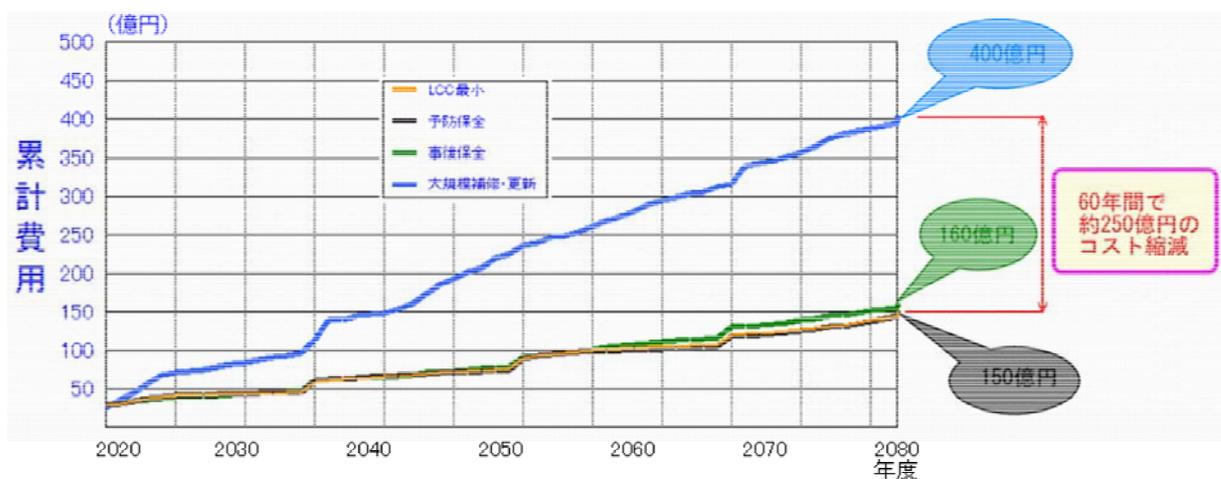

## 7. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

### 1) 計画策定担当部署

美唄市 都市整備部 都市整備課 TEL：0126-63-0132

### 2) 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所

寒地基礎技術研究グループ	寒地構造チーム	上席研究員	安中	新太郎
		総括主任研究員	今野	久志
		研究員	松田	伸吾

## 8. 補修優先順位の考え方

### 維持管理規格策定の基本方針

- 管理橋梁すべてを対象に、効率的・効果的なメリハリのある管理を実施するために、交通量や環境条件を考慮した維持管理区分の分類を行います。
- 損傷程度に応じるとともに、維持管理区分との関係から効率的な管理の実現を目指します。

維持管理区分判定基準

橋梁重要度	維持管理区分	内容
	<予防維持管理> A	①第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁
		②緊急輸送道路
		③橋長100m以上
		④D I D 地区
		⑤1級道路
		⑥塩害影響地域
	<事後維持管理> B	維持管理区分A以外
		橋長15m以上
	<観察維持管理> C	維持管理区分A・B以外
橋長15m未満		
第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁以外の自転車道等		

### 補修補強の優先順位付け

橋梁マネジメントシステムでは、以下に示す手順に基づき、補修補強の優先順位付けを各橋梁の部材単位(径間毎)で行っています。決定した優先順位は下表に○内の数字となります。

診断判定と維持管理区分から決まる優先順位

診断判定		維持管理区分		
		△(予防維持管理)	B(事後維持管理)	C(観察維持管理)
		高 ←—————→ 低 橋梁重要度		
I	良	—	—	—
II		⑦予防保全	⑧予防保全	⑨予防保全
III		④事後保全	⑤事後保全	⑥事後保全
IV		悪	①大規模補修・更新	②大規模補修・更新

## 9. 今後の取組

維持管理の更なる高度化、効率化を目指して、以下の取り組みを行います。

### 1) 新技術の活用、費用縮減

#### a. 橋梁点検における新技術の活用

1 巡目の定期点検で橋梁点検車を使用した橋梁については、新技術の活用としてドローンを用いた点検の採用を目指します。活用技術は「点検支援技術性能カタログ令和3年10月(国土交通省)」を参考に「マルチコプタを利用した橋梁点検システム」を想定します。点検対象橋梁は19橋を予定しています。約200万円のコスト縮減を目指します。

#### b. 補修工事における新技術の活用

修繕工法の選定の際には、従来の工法だけでなく、NETIS等に登録されている新工法を積極的に採用します。工法選定時は、①初期コストの比較だけでなく、ライフサイクルコストの低減が可能な工法を選定 ②塩害等の劣化要因を抑制することが可能な補修工法の採用 に留意して工法を選定します。

NETISにおける活用促進技術の一例を示す。

技術名称	技術概要
循環式ハイブリッドブラストシステム	橋梁補修補強工等において、鋼構造物の素地調整(1種ケレン)やコンクリート劣化部のチップングを行う循環式機能付ブラスト工法で、従来は、エアブラストで対応していた。本技術の活用により、ケレンかすから研削材を吸引再利用できるため、産業廃棄物を削減できる。
EPP(エコ・ペイント・ピーリング)工法	本技術は、水性剥離剤を、橋梁などの塗膜に塗布することで、塗膜を浮き上がらせ除去する工法です。従来はブラスト工法を用いていました。本技術の活用により、塗膜除去時の粉塵と騒音の発生を防止できます。塗膜に有害物質を含む場合は特に有効です。
コンクリート構造物の断面修復材料「ゴムラテシリーズ」	超速硬ポリマーセメントモルタルまたはコンクリートにより、劣化損傷したコンクリート構造物の断面修復を行う技術で、従来は、超速硬コンクリートで対応していた。本技術の活用により、乾燥収縮が小さく、付着性・耐久性に優れた断面修復が可能である。

### 2) 集約化・撤去

施設の老朽化、利用実態、周辺環境の変化を考慮して集約化・撤去などによる維持管理費用の縮減を図るため、令和8年度までに1橋の利用実態調査・撤去計画等を行います。【集約化対象1橋の集約化・撤去による修繕と比較した費用縮減効果の試算は59百万円。】

### 3) 令和8年度までの短期的な数値目標

#### a. 集約化・撤去に関する短期的な数値目標

管理する256橋のうち、1橋の集約化・撤去を検討します。

#### b. 新技術等の活用に関する短期的な数値目標

管理する256橋のうち、約1割の橋梁工事で新技術の活用を目指します。

#### c. 費用縮減に関する短期的な数値目標

管理する256橋のうち、19橋でドローンを用いた橋梁点検を実施し約200万円のコスト縮減を目指します。

【様式1-2】

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用				
							年度	判定区分									
美園橋	市道三井通	2001	12	15	R C橋	美州市字美明 79-373	2016	I	2021								
新橋	市道三井通	1984	65	14	P C橋	美州市字美明 1718-184	2016	I	2021								
北栄橋	市道南美明仲町線	1980	9.5	7	P C橋	美州市字美明 1718-63	2014	II	2019								
美德橋	市道進徳・南美明線	1994	18.2	9	R C橋	美州市字美明 1567-7	2016	II	2021	2029	2029	1.2百万					
明德橋	市道進徳・南美明線	1983	2.8	9	R C橋	美州市字美明 1447-20	2016	I	2021								
東進橋	市道進徳東1号線	1991	12.8	7.5	P C橋	美州市字美明 1444-133	2017	I	2022								
恒徳橋	市道東20線	1968	2.4	4.4	R C橋	美州市字美明 1440-41	2017	III	2022	2029	2029	0.6百万					
光北橋	市道上中の沢線	2013	11.5	6	R C橋	美州市字カウ シナフ587-3	2017	I	2022								
北亭橋	市道光珠内東21線	2014	11.2	11	R C橋	美州市字カウ シナフ641-13	2016	I	2021								
光陽橋	市道光珠内東線	2013	11.1	7.5	R C橋	美州市字カウ シナフ315-4	2017	I	2022								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年度	最新点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考							
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029									
栗園橋	A	市道三井通	12.0	2001	18	2016	対策内容 事業費																		
新橋	A	市道三井通	65.0	1994	35	2016	対策内容 事業費																		
北条橋	C	市道南美町中環線	9.5	1990	39	2014	対策内容 事業費																		
奥徳橋	A	市道速徳・南美町環線	18.2	1994	25	2016	対策内容 事業費																		
明徳橋	A	市道速徳・南美町環線	2.8	1993	36	2016	対策内容 事業費																		
東進橋	C	市道速徳東1号線	12.8	1991	28	2017	対策内容 事業費																		
徳徳橋	C	市道東20線	2.4	1988	51	2017	対策内容 事業費																		
光出橋	C	市道上中の沢線	11.5	2013	6	2017	対策内容 事業費																		
光香橋	A	市道光條内東21線	11.2	2014	5	2016	対策内容 事業費																		
光陽橋	C	市道光條内環線	11.1	2013	6	2017	対策内容 事業費																		

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	0.9百万				
							年度	判定区分									
東光橋	市道東22線	2012	21.1	6	R C橋	美郷市字カーク シマノ315-4	2016	I	2021								
筋交橋	市道東23線	1978	15.6	7	鋼溶接橋	美郷市字カーク シマノ283-7	2016	II	2021								
59号橋	市道東24線	1990	21.8	7.5	P C橋	美郷市字カーク シマノ372-1	2016	I	2021								
松下橋	市道東24線	1967	5.9	3	R C橋	美郷市字カーク シマノ671-1	2017	III	2022	主桁断面修復工ほか	2027	2027	0.9百万				
奥沢橋	市道東24線	1970	7.6	3	R C橋	美郷市字カーク シマノ671-1	2017	I	2022								
光春橋	市道東25線	2004	11.1	4	R C橋	美郷市字カーク シマノ372-3	2017	II	2022								
晴松橋	市道東26線	1978	18.8	6	鋼溶接橋	美郷市字カーク シマノ428-7	2016	II	2021								
峰隆橋	市道東27線	1969	20.4	4.5	鋼溶接橋	美郷市字カーク シマノ505-3	2016	II	2021								
川内橋	市道川内線	1985	14.5	9	P C橋	美郷市字カーク シマノ549-1	2017	I	2022								
小野橋	市道川内線	2001	12.2	7.5	P C橋	美郷市字光珠内 二巻川1920-1	2017	I	2022								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年度	最終点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考	
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
東光橋	B	市道東22線	21.1	2012	7	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
筋交橋	B	市道東23線	15.6	1978	41	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
59号橋	B	市道東24線	21.8	1990	29	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
松下橋	C	市道東24線	5.9	1997	52	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】						【主桁】断面修理工【橋台】差込対策工				0.9	
馬込橋	C	市道東24線	7.6	1970	49	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
光春橋	C	市道東25線	11.1	2004	15	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
晴桜橋	B	市道東26線	18.8	1978	41	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
藤原橋	B	市道東27線	20.4	1969	50	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
川内橋	C	市道川内線	14.5	1985	34	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
小野橋	C	市道川内線	12.2	2001	18	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用				
							年度	判定区分									
川向橋	市道峰延東部線	1981	16.9	7	P C橋	美里市字峰延 原野2647-4	2016	III	2021	主桁ひびわれ注入工ほか	2020	2020	19.4百万				
育種橋	市道光珠内東山1号線	1970	5.4	3.6	P C橋	美里市字カーウ シヨ4367-27	2017	III	2022	架換えBOXカハハトほか	2028	2028	13.9百万				
光林橋	市道光珠内2区東1号線	1982	6.3	3.5	P C橋	美里市字カーウ シヨ441-13	2017	I	2022								
光再橋	市道達徳東1号線	1979	5.3	4	P C橋	美里市字美明 1045-7	2017	I	2022								
光葉橋	市道光珠内山麓道路	1985	98	7.5	鋼溶接橋	美里市字カーウ シヨ41668-2	2016	I	2021								
蓮華橋	市道南美町下3条線	1983	13.7	3.3	鋼ハハット橋	美里市字美明 1717-13	2017	I	2022								
千種橋	市道南美町・入初線	1991	13.1	6.5	P C橋	美里市字美明 1718-125	2017	I	2022								
坂下橋	市道南美町・入初線	1975	7.4	3	P C橋	美里市字美明 2919-1	2017	II	2022								
美山橋	市道南美町・光珠内線	1971	13.4	7.5	鋼溶接橋	美里市字美明 1717-6	2016	III	2021	床版 打換工ほか	2026	2026	39.3百万				
長渡橋	市道明治通	1973	67.8	7	鋼溶接橋	美里市字美明 1356-15	2016	II	2021	橋台 断面修復工ほか	2024	2024	119.3百万				



構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果 年度	判定区分	次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用		
1 7 線 5 号橋	市道西 1 7 線	1984	7	7.5	P C 橋	美里市字上美 町7491	2017	I	2022						
1 7 線 8 号橋	市道西 1 7 線	1975	4.6	6	P C 橋	美里市字上美 町7352	2017	II	2022						
前畑橋	市道西 1 7 線	1999	30.6	6	R C 橋	美里市字茶臼内 原野1915-1	2016	I	2021						
青葉橋	市道西 1 7 線	1976	5.3	6	P C 橋	美里市字上美町 原野2469-1	2017	I	2022						
山元橋	市道西 1 7 線	1980	5.3	5.5	P C 橋	美里市字上美町 原野2603-2	2017	II	2022						
大江橋	市道西 1 7 線	2013	5.5	4	鋼溶接橋	美里市字上美町 原野2196-2	2017	I	2022						
拓栄橋	市道開発西 1 8 線	1980	7.3	7.2	P C 橋	美里市字上美町 4083-7	2017	III	2022	架換えBOXカーブ	2028	2028	19.6百万		
1 8 線橋	市道開発西 1 8 線	1998	44.5	7.5	鋼溶接橋	美里市字上美町 原野1512-3	2016	I	2021						
みのり橋	市道開発西 1 8 線	1991	9.5	7.5	P C 橋	美里市字上美 町原野5587	2017	II	2022						
丹誠橋	市道開発西 1 8 線	1982	7.4	7	P C 橋	美里市字上美 町5977	2017	II	2022						

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用開始年次	最新計画	対象の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考								
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029										
17線5号橋	C	市道西17線	7.0	1984	35	2017	対策内容 事業費																			
17線6号橋	C	市道西17線	4.6	1975	44	2017	対策内容 事業費																			
前畑橋	B	市道西17線	30.6	1999	20	2016	対策内容 事業費																			
青葉橋	C	市道西17線	5.3	1976	43	2017	対策内容 事業費																			
山元橋	C	市道西17線	5.3	1980	39	2017	対策内容 事業費																			
大江橋	C	市道西17線	5.5	2013	6	2017	対策内容 事業費																			
紀宗橋	C	市道開発西18線	7.3	1980	39	2017	対策内容 事業費																			
18線橋	B	市道開発西18線	44.5	1990	21	2016	対策内容 事業費																			
みのり橋	C	市道開発西18線	9.5	1991	28	2017	対策内容 事業費																			
丹波橋	C	市道開発西18線	7.4	1992	37	2017	対策内容 事業費																			

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	年度	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用	
								年度	判定区分						
1 8 線 2 0 号橋	市道開発西 1 8 線	1995	11.5	7	P C 橋	美里市字上美 町924	2017	II	2022						
秋星橋	市道西 1 9 線	2014	11.1	6	P C 橋	美里市字美明 1394-6	2017	I	2022						
佐藤橋	市道西 1 9 線	1970	6.4	7	P C 橋	美里市字美明 1933-31	2017	I	2022						
拓辰橋	市道西 1 9 線	1984	21.4	6.5	P C 橋	美里市字美明 7390	2016	I	2021						
1 9 線 1 1 号橋	市道西 1 9 線	2017	7	4.9	鋼溶接橋	美里市字上美 町4092-1	2017	I	2022						
安達橋	市道西 1 9 線	1995	27	7.5	鋼溶接橋	美里市字茶志 内原野45-1	2016	I	2021						
小川橋	市道西 1 9 線	1990	9.4	5.5	P C 橋	美里市字上美 町2431-6	2017	I	2022						
1 9 線 1 5 号橋	市道西 1 9 線	1972	7	5	R C 橋	美里市字上美明 原野2100-1	2017	I	2022						
1 9 線 1 8 号橋	市道西美明西 1 9 線	1989	9.4	5.5	P C 橋	美里市字大雷 3168-1	2017	I	2022						
1 9 線 1 9 号橋	市道西美明西 1 9 線	1968	4.5	5	P C 橋	美里市字大雷 6349	2017	II	2022						

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										備考			
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		事業費(百万円)		
18線20号橋	C	市道開成西18線	11.5	1955	24	2017	対策内容 事業費													
秋屋橋	C	市道西19線	11.1	2014	5	2017	対策内容 事業費													
佐藤橋	C	市道西19線	6.4	1970	49	2017	対策内容 事業費													
拓成橋	B	市道西19線	21.4	1984	35	2016	対策内容 事業費													
19線11号橋	C	市道西19線	7.0	2017	2	2017	対策内容 事業費													
安達橋	B	市道西19線	27.0	1995	24	2016	対策内容 事業費													
小川橋	C	市道西19線	9.4	1990	29	2017	対策内容 事業費													
19線15号橋	C	市道西19線	7.0	1972	47	2017	対策内容 事業費													
19線18号橋	C	市道西美晴西19線	9.4	1989	30	2017	対策内容 事業費													
19線19号橋	C	市道西美晴西19線	4.5	1968	51	2017	対策内容 事業費													

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用				
							年度	判定区分									
進栄橋	市道西20線	2015	11	6	R C橋	美州市字美明 1414-8	2017	I	2022								
上好橋	市道土美興・大富西20線	1970	22.5	4	鋼溶接橋	美州市字上美 明4131-1	2016	II	2021								
20線橋	市道土美興・大富西20線	1985	27.7	6	P C橋	美州市字上美興 原野2452-2	2016	I	2021								
豊栄橋	市道土美興・大富西20線	1991	4.6	4	R C橋	美州市字上美興 原野2680-1	2017	I	2022								
豊皇橋	市道西16号線	1994	9.4	5	P C橋	美州市字上美 明3374-3	2017	II	2022								
20線18号橋	市道土美興・大富西20線	1989	9.4	5.5	P C橋	美州市字大富 3930-1	2017	I	2022								
20線19号橋	市道土美興・大富西20線	1977	4.5	5.1	P C橋	美州市字大富 3154-5	2017	II	2022								
三日月橋	市道土美興・大富西20線	1994	11.5	7	P C橋	美州市字上美 明2087-12	2017	I	2022								
栄徳橋	市道西21線	2015	11.4	7.5	R C橋	美州市字カウ ツナフ641-1	2017	I	2022								
光拓橋	市道西21線	1972	5.4	7.5	P C橋	美州市字上美興 原野3753-3	2016	I	2021								



構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費	
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	2016	判定区分	2021	2029	2029	補修費用
							年度	II										
2 1 線橋	市道西 2 1 線	1979	64.8	7.5	鋼溶接橋	美瑛市字上美瑛 原野438-1-1	2016	II	2021	伸縮装置 取替工ほか	2029	2029	2016	II	2021	2029	12.2百万	
明星橋	市道西 2 1 線	1976	5.4	7.5	P C 橋	美瑛市字上美瑛 町4117-1	2016	I	2021									
第 4 幹川橋	市道西 2 1 線	1984	24.8	7.5	鋼溶接橋	美瑛市字上美瑛 町4150-5	2016	II	2021	伸縮装置 取替工ほか	2029	2029	2016	II	2021	2029	12.0百万	
松田橋	市道西 2 1 線	1991	32.1	7.6	P C 橋	美瑛市字上美瑛 原野248-3	2016	I	2021				2016	I	2021			
下中の沢橋	市道光珠内西 2 1 線	1975	3.5	7.4	P C 橋・R C 橋	美瑛市光珠内 648-19	2016	III	2021	架換えBOX加ハ - ト	2022	2022	2016	III	2021	2022	29.2百万	
再来橋	市道西 2 2 線	1983	5.3	4.5	P C 橋	美瑛市字上美瑛 町312-13	2017	I	2022				2017	I	2022			
2 3 線橋	市道西 2 3 線	1980	20	7	鋼溶接橋	美瑛市字光珠 内3004-2	2016	II	2021				2016	II	2021			
9 0 号線	市道西 2 3 線	1979	7.4	7	P C 橋	美瑛市字光珠 内2405-8	2017	II	2022				2017	II	2022			
光生橋	市道西 2 4 線	1984	16.7	7.5	P C 橋	美瑛市字光珠 内3988-2	2016	I	2021				2016	I	2021			



構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度					
							年度	判定区分									
光福橋	市道西24線	1985	4.1	19.4	R C橋	美里市字光珠 内2408-45	2017	I	2022				補修費用				
福島橋	市道西24線	1985	11.5	7.5	P C橋	美里市字光珠 内2408-31	2017	I	2022								
光輝橋	市道西25線	1970	3.7	3.4	木橋	美里市字カウ シナ1422-5	2017	I	2022								
光南橋	市道西25線	1991	8.4	5.5	P C橋	美里市字光珠 内3236	2017	I	2022								
雪水橋	市道西26線	1993	8.4	4.5	P C橋	美里市字光珠 内6709	2017	I	2022								
珠輝橋	市道西26線	1985	2.6	4.5	R C橋	美里市字光珠 内2412-58	2017	I	2022								
光明橋	市道光珠内西1号線・1	1975	6.3	5.6	P C橋	美里市字カウ シナ1299-1	2017	III	2022	橋台断面修復工ほか	2029	2029	2.2百万				
若草橋	市道光珠内西1号線・1	1970	4	3.5	R C橋	美里市字カウ シナ1306-7	2017	II	2022								
若竹橋	市道光珠内西1号線・1	2013	4	3.1	鋼溶接橋	美里市字カウ シナ1633-3	2017	III	2022	支承モルタル打換工ほか	2029	2029	2.9百万				
光篤橋	市道光珠内西1号線・2	1991	8.4	5.5	P C橋	美里市字カウ シナ16742	2017	I	2022								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対象の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029									
光福橋	C	市道西24線	4.1	1985	34	2017	対策内容 事業費																			
福高橋	C	市道西24線	11.5	1985	34	2017	対策内容 事業費																			
光輝橋	C	市道西25線	3.7	1970	49	2017	対策内容 事業費																			
光賢橋	C	市道西25線	8.4	1991	28	2017	対策内容 事業費																			
雪水橋	C	市道西26線	8.4	1993	26	2017	対策内容 事業費																			
球網橋	C	市道西26線	2.6	1985	34	2017	対策内容 事業費																			
光明橋	C	市道光線内西1号線*1	0.3	1975	44	2017	対策内容 事業費																			
若草橋	C	市道光線内西1号線*1	4.0	1970	49	2017	対策内容 事業費																			
若竹橋	C	市道光線内西1号線*1	4.0	2013	6	2017	対策内容 事業費																			
光風橋	C	市道光線内西1号線*2	8.4	1991	28	2017	対策内容 事業費																			

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	年度	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用	
								判定区分	年度						
光進橋	市道進徳3区南1号線	1982	7.3	3.6	P C橋	美里市字美明 1428-19	2017	I	2022						
6 3 号橋	市道進徳3区北1号線	1998	5.5	5.5	P C橋	美里市字美明 1499-62	2017	I	2022						
西川橋	市道進徳3区南2号線	1991	13.1	5	P C橋	美里市字美明 1819-2	2017	I	2022						
心光橋	市道進徳3区南2号線	1982	7.3	4.5	P C橋	美里市字美明 1423-12	2017	I	2022						
米沢農場橋	市道下中の京・大瀬西2号線	1990	5.9	8.2	P C橋	美里市字カーク シナジ648-4	2017	I	2022						
光年橋	市道下中の京・大瀬西2号線	1964	11.2	3.1	木橋	美里市字カーク シナジ649-9	2017	III	2022						
万粒橋	市道下中の京・大瀬西2号線	1977	6	7	P C橋	美里市字峰延 7001	2017	I	2022						
追分橋	市道下中の京・大瀬西2号線	2000	7.3	7.5	P C橋	美里市字峰戸街 追分分1314-1	2017	II	2022						
6 2 号橋	市道進徳西1号線	2000	3.7	6	R C橋	美里市字美明 1352-5	2017	I	2022						
進徳橋	市道進徳西1号線	1990	11.8	6	P C橋	美里市字美明 1507-42	2017	II	2022						

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	更新点検年次	修繕計画	対象の内容・時期・事業費(百万円)											事業費(百万円)	備考							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029										
光道橋	C	市道通徳3区南1号線	7.3	1982	37	2017	対策内容																				
63号橋	C	市道通徳3区北1号線	5.5	1998	21	2017	事業費																				
西川橋	C	市道通徳3区南2号線	13.1	1991	28	2017	対策内容																				
心光橋	C	市道通徳3区南2号線	7.3	1982	37	2017	事業費																				
米沢橋場橋	C	市道下中の沢・大瀬西2号線	5.9	1990	29	2017	対策内容																				
光年橋	C	市道下中の沢・大瀬西2号線	11.2	1964	55	2017	事業費																				
万福橋	C	市道下中の沢・大瀬西2号線	8.0	1977	42	2017	対策内容																				
遠分橋	C	市道下中の沢・大瀬西2号線	7.3	2000	19	2017	事業費																				
62号橋	C	市道通徳西1号線	3.7	2000	19	2017	対策内容																				
運徳橋	C	市道通徳西1号線	11.8	1990	29	2017	事業費																				

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用				
							年度	判定区分									
6 1 号橋	市道進徳西 2 号線	1985	3.7	7.5	R C 橋	美里市字美明 1341-5	2016	I	2021								
曾進橋	市道進徳西 2 号線	1988	11.8	7.5	P C 橋	美里市字美明 1507-60	2016	I	2021								
光寿橋	市道進徳西 2 号線	1985	6	7.5	P C 橋	美里市字美明 1509-23	2016	I	2021								
陽吉橋	市道下中の京西 3 号線	1995	49.2	6	鋼溶接橋	美里市字カウ ヶノ442	2016	I	2021								
一心橋	市道進徳 3 区南 3 線	1993	12	4	P C 橋	美里市字美明 1933-12	2017	I	2022								
西浦橋	市道開流・峰延西 5 号線	1984	51.6	7.5	鋼溶接橋	美里市字美明 2178-4	2016	II	2021								
幾北橋	市道開流・峰延西 5 号線	1983	48.4	7.5	鋼溶接橋	美里市字光珠 内4452-10	2016	I	2021								
峰星橋	市道開流・峰延西 5 号線	1980	12.6	7.5	P C 橋	美里市字峰延 6903	2017	II	2022								
石北橋	市道北条明・峰延西 6 号線	1986	11.2	7.5	P C 橋	美里市字開梁 原野4695-4	2017	II	2022								
千秋橋	市道北条明・峰延西 6 号線	1985	7	7.5	P C 橋	美里市字開梁 原野4524-5	2017	II	2022								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対象の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考				
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
G1号橋	A	市道通徳西2号線	3.7	1955	34	2016	対策内容															
							事業費															
杏道橋	A	市道通徳西2号線	11.8	1998	31	2016	対策内容															
							事業費															
光善橋	A	市道通徳西2号線	6.0	1995	34	2016	対策内容															
							事業費															
南型橋	B	市道下中心沢西3号線	49.2	1993	24	2016	対策内容															
							事業費															
一心橋	C	市道徳3区第3号線	12.0	1993	26	2017	対策内容															
							事業費															
西浦橋	B	市道開発・峰豆西5号線	51.6	1984	35	2016	対策内容															
							事業費															
泉北橋	B	市道開発・峰豆西5号線	48.4	1983	36	2016	対策内容															
							事業費															
峰臺橋	C	市道開発・峰豆西5号線	12.6	1960	39	2017	対策内容															
							事業費															
石北橋	C	市道北美町・峰豆西6号線	11.2	1996	33	2017	対策内容															
							事業費															
千代橋	C	市道北美町・峰豆西6号線	7.0	1995	34	2017	対策内容															
							事業費															

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用				
							年度	判定区分									
開桜橋	市道北美明・峠樺西6号線	1985	8.7	7.5	P C橋	美明市字開桜 原野4695-1	2017	II	2022								
開明橋	市道北美明・峠樺西6号線	1985	87.1	7	鋼溶接橋	美明市字茶志 内3518-2	2016	II	2021								
開沼橋	市道北美明・峠樺西6号線	1985	9	7.5	P C橋	美明市字茶志内 原野1565-10	2017	I	2022								
6号2幹川橋	市道北美明・峠樺西6号線	1983	15.8	6.5	P C橋	美明市字上美明 原野2169-5	2016	I	2021								
拓北橋	市道北美明・峠樺西6号線	1990	32	7.5	鋼溶接橋	美明市字上美 明7420	2016	II	2021								
西岡橋	市道北美明・峠樺西6号線	1985	45.7	7.5	鋼溶接橋	美明市字上美明 原野3755-1	2016	II	2021								
豊中橋	市道北美明・峠樺西6号線	1993	10.5	7.5	P C橋	美明市字上美明 原野4210-4	2017	II	2022								
開七橋	市道開茂西7号線	1991	2.9	6.5	R C橋	美明市字茶志内 原野1510-3	2017	I	2022								
堀川橋	市道拓北・峠樺西7号線	1987	43.3	6	鋼溶接橋	美明市字上美明 原野3750-1	2016	I	2021								
豊穀橋	市道拓北・峠樺西7号線	1993	12.5	6	P C橋	美明市字上美 明4236	2017	II	2022								

橋名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年度	最新点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										備考						
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		事業費(百万円)					
開張橋	C	市道北美町・峰西6号線	8.7	1985	34	2017	対策内容																
							事業費																
開張橋	B	市道北美町・峰西6号線	8.7	1985	34	2016	対策内容																
							事業費																
開張橋	C	市道北美町・峰西6号線	9.0	1985	34	2017	対策内容																
							事業費																
6号2段川橋	B	市道北美町・峰西6号線	15.8	1983	36	2016	対策内容																
							事業費																
拓北橋	B	市道北美町・峰西6号線	32.0	1990	29	2016	対策内容																
							事業費																
西園橋	B	市道北美町・峰西6号線	45.7	1983	34	2016	対策内容																
							事業費																
豊中橋	C	市道北美町・峰西6号線	10.5	1993	26	2017	対策内容																
							事業費																
開七橋	C	市道開張西7号線	2.9	1991	28	2017	対策内容																
							事業費																
堀川橋	B	市道拓北・峰西7号線	43.3	1997	32	2016	対策内容																
							事業費																
豊秋橋	C	市道拓北・峰西7号線	12.5	1993	26	2017	対策内容																
							事業費																

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用				
							年度	判定区分									
北桜井橋	市道西10号線	1977	9.7	4	P C橋	美咲市字開発 4505-5	2017	I	2022								
親和橋	市道西10号線	1972	5.5	4.5	P C橋	美咲市字赤志内 原野2765-1	2017	I	2022								
開親橋	市道西10号線	1977	88.1	6	鋼溶接橋	美咲市字赤志 内117-234	2016	II	2021	橋脚 断面修復工ほか	2022	2022	92.7百万				
豊西橋	市道西10号線	1982	66.1	7.5	鋼溶接橋	美咲市字上美咲 原野4079-3	2016	I	2021								
10号橋	市道西10号線	1981	50.1	7.5	鋼溶接橋	美咲市字上美咲 原野4385-1	2016	I	2021								
峰権10号橋	市道西10号線	1985	8.5	7.5	P C橋	美咲市字上美 原野4395	2017	II	2022								
共栄橋	市道開発中小屋線	1965	3	7	R C橋	美咲市字赤志内 原野118-66	2017	I	2022								
小松橋	市道開発中小屋線	1976	35	7.5	鋼溶接橋	美咲市字上美 原野1793-3	2016	I	2021								
22線橋	市道開発中小屋線	1977	28.7	7.5	鋼溶接橋	美咲市字上美咲 原野2595-20	2016	II	2021								
東栄橋	市道西11号線	1987	17.5	6	鋼溶接橋	美咲市字上美 原野4091-3	2016	II	2021								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年度	最新点検年度	修繕計画	対象の内容・時期・事業費(百万円)										備考					
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		事業費				
北桜井橋	C	市道西10号線	8.7	1977	42	2017	対策内容 事業費																
新利橋	C	市道西10号線	5.5	1972	47	2017	対策内容 事業費																
開敷橋	B	市道西10号線	88.1	1977	42	2016	対策内容 事業費																
豊西橋	B	市道西10号線	66.1	1922	37	2016	対策内容 事業費																92.7
10号橋	B	市道西10号線	50.1	1981	38	2016	対策内容 事業費																
峠陣10号橋	C	市道西10号線	8.5	1985	34	2017	対策内容 事業費																
共栄橋	C	市道開発中小屋線	3.0	1965	54	2017	対策内容 事業費																
小松橋	B	市道開発中小屋線	35.0	1976	43	2016	対策内容 事業費																
22原橋	B	市道開発中小屋線	28.7	1977	42	2016	対策内容 事業費																
東栄橋	B	市道西11号線	17.5	1997	32	2016	対策内容 事業費																

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度					
							年度	判定区分									
野菊橋	市道上美町西12号線	1987	17.5	6	鋼溶接橋	美州市字上美町 原野2074-8	2016	I	2021				補修費用				
豊蔵橋	市道上美町西14号線	1997	3.7	7.4	R C橋	美州市字上美町 唯2431-4	2017	I	2022								
山形橋	市道西16号線	1982	2.4	6	R C橋	美州市字茶志 内126-67	2016	I	2021								
銀嶺橋	市道西16号線	1973	2.9	10.2	R C橋	美州市字上美町 原野3035-10	2017	I	2022								
小山橋	市道西19号線	1988	10.4	7	P C橋	美州市字上美町 唯3951-5	2017	I	2022								
晩生内橋	市道晩生内線	1985	4.2	9.8	R C橋	美州市字茶志 内117-25	2016	II	2021	主桁断面修復工ほか	2029	2029	5.1百万				
尾花橋	市道元村西14号線	1987	3.3	5.5	R C橋	美州市字茶志 内118-72	2017	I	2022								
草刈橋	市道沼の内西14号線	1972	5	2.7	鋼溶接橋	美州市字茶志 内4686-4	2016	III	2021	架換えBOXカハート	2026	2026	10.6百万				
開新橋	市道西13号線	1996	6.3	7.5	P C橋	美州市字開架 原野4560	2017	I	2022								
山角橋	市道西13号線	1996	6.4	7.5	P C橋	美州市字茶志 内4524-1	2017	II	2022								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最終点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考		
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
野洲橋	B	市道上美原西12号線	17.5	1997	32	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
豊満橋	C	市道上美原西14号線	3.7	1997	22	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
山形橋	A	市道西16号線	2.4	1992	37	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
須原橋	C	市道西16号線	2.9	1973	46	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
小山橋	C	市道西19号線	10.4	1988	31	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
晩生内橋	A	市道晩生内線	4.2	1983	34	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												【主桁】ひびわれ注入工 断面修復工 【橋台】ひびわれ注入工 断面修復工 【端壁】部分打換工
尾花橋	C	市道元村西14号線	3.3	1987	32	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】												5.1
草刈橋	A	市道沼の内西14号線	5.0	1972	47	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
開新橋	C	市道西13号線	6.3	1996	23	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
山角橋	C	市道西13号線	6.4	1996	23	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】												

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度					
							年度	判定区分									
苗田橋	市道田所線	2006	19.7	5	P C 橋	美里市字美明 1495-22	2016	I	2021				補修費用				
稲穂通橋	市道稲穂通	1976	2.1	8.5	P C 橋	美里市東2条-記2 丁目1491-5	2016	I	2021								
宝寿橋	市道開発西1.1線	1977	6.4	4.5	P C 橋	美里市字開発 原野4696-1	2017	I	2022								
奔美噴橋	市道西1.0線	1977	22.8	7	P C 橋	美里市字美明 1174-3	2016	I	2021								
道徳橋	市道西1.0線	1979	24.4	7	鋼溶接橋	美里市字美明 1481-19	2016	II	2021	伸縮装置 取替工ほか	2029	2029	26.0百万				
稲見橋	市道西1.0線	1966	54.5	6	鋼溶接橋	美里市字沼の 内1606-2	2016	III	2021		2019	2019					
扶橋	市道西1.0線	1995	20.8	7.5	P C 橋	美里市字開発 原野4611-4	2016	I	2021								
1.0線橋	市道西1.0線	1968	114.9	6	鋼溶接橋	美里市字開発 原野4726-2	2016	III	2021	橋台 断面修復工ほか	2025	2025	121.8百万				
9線橋	市道西9線	1983	54	4	鋼溶接橋	美里市字沼の 内1607-13	2016	I	2021								
栄橋	市道西9線	1975	83.3	6	鋼溶接橋	美里市字上美明 原野2835-4	2016	III	2021	床版 断面修復工ほか	2023	2023	131.2百万				



構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	20.6百万				
							年度	判定区分									
豊進橋	市道西5線	1972	8.5	7	P C橋	美州市字上美明 原野5600-4	2017	III	2022	架換えBOXカルト	2028	2028	20.6百万				
北星橋	市道西4線	1998	24.8	7.5	P C橋	美州市字上美 原野5112	2016	I	2021								
4線5号橋	市道西4線	1997	7.2	7.5	P C橋	美州市字上美明 原野5594-1	2016	I	2021								
古野橋	市道茶志内西1号線	2014	6	4	鋼溶接橋	美州市字茶志 P4800-1	2017	I	2022								
石合橋	市道茶志内西1号線	1985	37.6	4.5	鋼溶接橋	美州市字茶志 P4890-29	2016	II	2021								
すすき橋	市道癸巴西1号線	2007	21.8	6	P C橋	美州市字美明 1485-1	2016	I	2021								
300間橋	市道癸巴西1号線	1979	15.4	4	鋼溶接橋	美州市字美明 1176-4	2016	II	2021								
縮吉橋	市道癸巴・茶志内西2号線	2001	18.7	4.5	P C橋	美州市字美明 1482-3	2016	I	2021								
500間橋	市道癸巴・茶志内西2号線	1979	15	4	鋼溶接橋	美州市字美明 1477-34	2014	II	2019								
茶清橋	市道癸巴・茶志内西2号線	1992	5.9	6	P C橋	美州市字茶志 内1693-6	2017	I	2022								



構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	16.8百万				
							年度	判定区分									
相築橋	市道桑田・茶志内西2号線	1970	5.3	6	P C橋	美明市字茶志 内1592-19	2017	III	2022	架換えBOXカルト	2028	2028	16.8百万				
中央橋	市道西3号線	1999	38.6	7.5	鋼溶接橋	美明市字茶志 の内1614-5	2016	I	2021								
殖民橋	市道西3号線	1979	24.4	7.5	鋼溶接橋	美明市字茶志 の内1067-30	2016	II	2021	支承モルタル打換工ほか	2029	2029	13.4百万				
及川橋	市道茶志内西2の2号線	1992	15.1	7.5	P C橋	美明市字上美明 原野4444-1	2016	I	2021								
北西橋	市道茶志内西2の2号線	1986	2.9	8	R C橋	美明市字上美明 原野4440-6	2017	I	2022								
横谷橋	市道沼の内西3号線	1997	37.4	5	P C橋	美明市字茶志 の内2334-8	2016	I	2021								
沼徳橋	市道沼の内西3号線	2006	42.7	6	P C橋	美明市字茶志 の内2057-27	2016	I	2021								
産化3号橋	市道西3号線	1989	53.3	7.5	鋼溶接橋	美明市字茶志内 2887-40	2016	I	2021								
香苗橋	市道西3号線	1981	2.6	11	R C橋	美明市字上美明 原野2826-39	2016	I	2021								
6線3号橋	市道西3号線	1988	10.2	7.5	P C橋	美明市字上美明 原野2979-1	2016	I	2021								



構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度					
							年度	判定区分									
堰本橋	市道西3号線	1988	9.2	7.5	P C橋	美明市字上美明 原野4026-1	2016	I	2021				補修費用				
3線3号橋	市道西3号線	1986	2.9	9	R C橋	美明市字上美明 原野4026-2	2017	I	2022								
桑折橋	市道沼の内西4号線	1992	45.2	5	P C橋	美明市字美野沼 の内2331-9	2016	I	2021								
伊藤橋	市道沼の内西4号線	1974	41.8	4.5	鋼溶接橋	美明市字美野沼 の内2340-1	2016	III	2021	橋脚断面修復工ほか	2027	2027	23.8百万				
世紀橋	市道北沼・茶志内西4号線	1982	7.3	4.5	P C橋	美明市字上美明 原野2827-2	2017	I	2022								
5号線橋	市道北沼・茶志内西5号線	1988	72.2	7	鋼溶接橋	美明市字上美明 原野4742-1	2016	I	2021								
新菊橋	市道北沼・茶志内西5号線	1988	8.4	7.5	P C橋	美明市字茶志 内30177-10	2017	II	2022								
6線5号橋	市道北沼・茶志内西5号線	1982	7.3	4.5	P C橋	美明市字上美明 原野3615-2	2017	I	2022								
わらび橋	市道北沼・中村西7号線	1988	8.4	5.5	P C橋	美明市字美野原 野4476-3	2017	I	2022								
元旦橋	市道西15号線	1977	3.1	9.2	R C橋	美明市字茶志 内1126-80	2016	I	2021								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年度	最終点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考								
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029										
榎木橋	A	市道西5号線	9.2	1985	31	2016	対策内容																			
							事業費																			
3条3号橋	C	市道西5号線	2.9	1986	33	2017	対策内容																			
							事業費																			
桑折橋	B	市道沼の内西4号線	45.2	1992	27	2016	対策内容																			
							事業費																			
伊藤橋	B	市道沼の内西4号線	41.8	1974	45	2016	対策内容																			
							事業費																			
掛紙橋	C	市道北沼・茶志内西4号線	7.3	1982	37	2017	対策内容																			
							事業費																			
5号線橋	B	市道北美町・茶志内西5号線	72.2	1988	31	2016	対策内容																			
							事業費																			
新築橋	C	市道北美町・茶志内西5号線	8.4	1988	31	2017	対策内容																			
							事業費																			
6条5号橋	C	市道北美町・茶志内西5号線	7.3	1982	37	2017	対策内容																			
							事業費																			
わさこ橋	C	市道北美町・中井西7号線	8.4	1988	31	2017	対策内容																			
							事業費																			
元巨橋	A	市道西15号線	3.1	1977	42	2016	対策内容																			
							事業費																			

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度					
							年度	判定区分									
学田橋	市道学田地線	1968	63.4	4	鋼溶接橋	美里市字美明 1451-170	2016	III	2021		2018	2018		補修費用			
入初橋	市道沼田の坂・落合線	1967	30.8	4.5	鋼溶接橋	美里市字美明 1724-88	2016	II	2021	床版 打換工ほか	2020	2020		76.4百万			
落合橋	市道沼田の坂・落合線	1968	19.1	4.5	鋼溶接橋	美里市字美明 1541-44	2016	II	2021	橋台 断面修復工ほか	2021	2021		31.0百万			
満月橋	市道東田所線	1967	13.1	4	鋼溶接橋	美里市字美明 1464-7	2016	III	2021		2019	2019					
田園橋	市道かえで通	1967	13	9.2	鋼溶接橋	美里市字美明 1131-6	2016	III	2021		2019	2019					
明月橋	市道東10線	2004	11.9	6	R C橋	美里市字美明 1150-8	2017	I	2022								
上月橋	市道東10線	2003	11.6	6	P C橋	美里市字美明 1150-11	2017	I	2022								
魚籠橋	市道奔美咲線	1967	6.4	4.1	P C橋	美里市字ホンビ ハイ1557-1	2017	III	2022	袖擁壁 断面修復工	2027	2027		0.6百万			
木挽橋	市道奔美咲線	1967	4.5	5.6	R C橋	美里市字ホンビ ハイ2502-78	2017	II	2022								
鯉橋	市道奔美咲線	1967	3.8	5.5	R C橋	美里市字ホンビ ハイ1178-2	2017	I	2022								

橋名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年度	最終点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										備考			
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		事業費(百万円)		
宇田橋	B	市道宇田沼線	63.4	1965	51	2016	事業費	【橋梁点検】												
入初橋	B	市道沼田の原・落合線	30.8	1977	52	2016	事業費	【橋梁点検】												
落合橋	B	市道沼田の原・落合線	19.1	1998	51	2016	事業費	76.4	【主桁】塗装工事【欄干】塗装工事【原形】部分打除工 表面養生工 補修防水工 【橋台】断面修繕工のひびき注入【改築】部分打除工 【橋脚基礎】取替工【防凍壁】取替工 【地盤】打除工【補修】部分打除工											76.4
湖月橋	C	市道東田所線	13.1	1977	52	2016	事業費	31.0	【主桁】鋼材 塗装工事【橋脚】補修防水工 【橋台】断面修繕工かごマット工、ブロック積重ね補修工 【改築】モルタル打除工【明暗框】取替工 【防凍壁】取替工【地盤】打除工											31.0
田園橋	A	市道かえで道	13.0	1977	52	2016	事業費	【橋梁点検】												
明月橋	C	市道東10線	11.9	2004	15	2017	事業費	【橋梁点検】												
上月橋	C	市道東10線	11.6	2003	16	2017	事業費	【橋梁点検】												
魚淵橋	C	市道深美河線	6.4	1977	52	2017	事業費	【橋梁点検】												
木崎橋	C	市道深美河線	4.5	1977	52	2017	事業費	【橋梁点検】												0.6
藤橋	C	市道深美河線	3.8	1977	52	2017	事業費	【橋梁点検】												

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果 年度	判定区分	次回点検年度	対策内容		着手年度	完了年度	対策に係る 全体概算事業費			
										補修内容 (主な措置内容)	補修費用						
徳徳橋	市道産化美明線	1968	15.7	4	鋼溶接橋	美明市字中ノツ F1017-12	2016	II	2021	架換えBOXカルト	2021	2021	6.0百万				
もみじ橋	市道産化美明線	1970	5.5	4.8	R C橋	美明市字中ノツ美 明2461-7	2016	II	2021	架換え(橋梁)	2022	2022	68.0百万				
白竜橋	市道産化美明線	1974	6.1	4.8	R C橋	美明市字中ノツ美 明1805-2	2016	II	2021								
泉源橋	市道産化美明線	1970	12.5	3.5	P C橋	美明市字中ノツ美 明2461-3	2017	I	2022								
香月橋	市道東7線	1968	13.8	4.1	鋼溶接橋	美明市字中ノツ F1018-25	2017	II	2022		2021	2021	他事業で架換(開発局)				
黄金橋	市道東6線	2004	13.6	4	R C橋	美明市字中ノツ F1019-14	2017	I	2022								
鈴木橋	市道東5線	1972	3	4.5	R C橋	美明市字茶志 内1973-8	2017	II	2022								
栄芦橋	市道東5線	1968	17.6	4	鋼溶接橋	美明市字中ノツ F1684-3	2016	III	2021		2021	2021	他事業で架換(開発局)				
日東中央橋	市道東4線	1980	20.1	8.5	鋼溶接橋	美明市字茶志 内1022-5	2016	II	2021	床版ひびわれ注入工ほか	2029	2029	15.4百万				
月良橋	市道東3線	1970	2.4	4	R C橋	美明市字中ノツ F16531	2017	I	2022								



構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用				
							年度	判定区分									
東橋	市道美巴・茶志内側線	1982	10.4	3	P C 橋	美里市字ササノ F16522	2017	I	2022								
日東橋	市道東5の3線	1968	18	4	鋼溶接橋	美里市字ササノ F11019-14	2016	II	2021	架換えBOXカーブト	2021	2021	6.0百万				
日菱橋	市道茶志内東1線	2004	13.9	5	R C 橋	美里市字ササノ F11022-5	2017	I	2022								
朝日橋	市道茶志内東1線	1981	16.2	4.5	P C 橋	美里市字ササノ F1728-20	2016	III	2021	主桁ひびわれ注入工ほか	2026	2026	8.8百万				
大菜橋	市道落合の沢線	1975	7.4	4	P C 橋	美里市字美明 1541-1	2017	II	2022								
滝の沢橋	市道滝の沢線	1982	10.4	4.5	P C 橋	美里市字美明 2294-1	2017	I	2022								
我路の沢橋	市道我路の沢線	1968	11.5	3.7	P C 橋	美里市字美明 2296-1	2017	I	2022								
双流橋	市道常盤台線	1971	34.9	6.5	鋼溶接橋	美里市字美明 1849-1	2016	III	2021	支承支承補修ほか	2024	2024	14.5百万				
屯田橋	市道しらかば通	1968	13	7	鋼溶接橋	美里市字美明 1461-12	2016	III	2021		2020	2020	他事業で架換(開発局)				
聖華橋	市道東雲線	1980	5.4	4.5	P C 橋	美里市字美明 1451-405	2016	I	2021								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考								
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029										
東橋	C	市道東巴茶志内橋線	10.4	1982	37	2017	対策内容																			
							事業費																			
白雲橋	B	市道東5の3線	18.0	1988	51	2016	対策内容	2021年度架設予定(負担金有り)																		
							事業費	6.0																		6.0
白雲橋	C	市道茶志内東1線	13.9	2004	15	2017	対策内容																			
							事業費																			
朝日橋	B	市道茶志内東1線	16.2	1981	38	2016	対策内容																			
							事業費																			
大東橋	C	市道落合の沢線	7.4	1975	44	2017	対策内容																			
							事業費																			
海の沢橋	C	市道海の沢線	10.4	1982	37	2017	対策内容																			
							事業費																			
我路の沢橋	C	市道我路の沢線	11.5	1988	51	2017	対策内容																			
							事業費																			
及深橋	B	市道常盤台線	34.9	1971	48	2016	対策内容																			
							事業費																			
屯田橋	A	市道しらかほ通	13.0	1988	51	2016	対策内容																			
							事業費																			14.5
聖華橋	A	市道東雲線	5.4	1980	39	2016	対策内容																			
							事業費																			

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度					
							年度	判定区分									
南雲橋	市道東雲南1線	1982	2.4	3	R C橋	美里市字美明 18-53	2016	I	2021				補修費用				
菜の花橋	市道東2条・菜の花線	2001	12	7.5	R C橋	美里市字美明 79-165	2017	II	2022								
美角橋	市道北東2条通	1970	3.2	10	P C橋	美里市字美明 1081-67	2016	I	2021								
朝風橋	市道旭北1号線	1966	3.9	3.3	鋼溶接橋	美里市字美明 1081-29	2016	I	2021								
旭3条橋	市道東3条通	1970	4.7	9.2	R C橋	美里市字美明 1081-26	2016	II	2021	主桁 断面修復工ほか	2029	2029	1.9百万				
早瀬橋	市道菜の花通	1970	7.1	5.5	P C橋	美里市字美明 1114-23	2016	I	2021								
岡部橋	市道すずかけ通	2002	20.8	7	P C橋	美里市字美明 1487-28	2016	I	2021								
新川橋	市道新川通	1974	15.6	31	P C橋	美里市字美明 1246-66	2016	I	2021								
近野橋	市道泉・中央小北線	2001	12.4	8	P C橋	美里市字美明 1255-66	2016	I	2021								
柳橋(その1)(車)	市道昭和通	1970	4.2	9	R C橋	美里市字美明 1267-9	2016	I	2021								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対象の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考	
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
南濃橋	A	市道東濃町線	2.4	1962	37	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
菜の花橋	C	市道東之条・菜の花線	12.0	2001	18	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
菜肉橋	A	市道北菜2条通	3.2	1970	49	2016	対策内容 事業費													
朝風橋	A	市道旭北1号線	3.9	1966	53	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
旭3条橋	A	市道東3条通	4.7	1970	49	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
早瀬橋	A	市道菜の花通	7.1	1970	49	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												1.9
園部橋	B	市道すかけ通	20.8	2002	17	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
新川橋	A	市道新川通	15.6	1974	45	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
近野橋	A	市道浜・中央小北線	12.4	2001	18	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												
樽橋(元の1)(車)	A	市道昭和通	4.2	1970	49	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】												

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果			次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用			
							年度	判定区分	年度								
柳橋(その2)(歩)	市道昭和通	1970	10.1	1.5	鋼溶接橋	美里市字美明 1267-9	2016	II	2021	伸縮装置 取替工ほか	2029	2029	13.1百万				
新中央橋	市道中央通	1974	10.6	21.9	P C橋	美里市字美明 1267-22	2016	I	2021								
第2中央橋	市道すすらん通	1979	10.5	10.9	P C橋	美里市字美明 1285-4	2014	III	2019	伸縮装置 取替工ほか	2023	2023	17.0百万				
銀栄橋	市道新生通	1967	4.1	7.2	P C橋	美里市字美明 1271-21	2016	III	2021	架換えBOX加幅 ト	2021	2021	13.9百万				
昭建橋	市道記念線	1967	3.6	4.2	木橋	美里市字美明 1491-3	2016	II	2021	主桁 取替工	2029	2029	0.7百万				
銀河橋	市道記念線	1965	3.3	9	R C橋	美里市字美明 1815-1	2016	II	2021	主桁 断面修復工ほか	2029	2029	3.1百万				
開運橋	市道沼貝線	1970	2.8	7.1	R C橋	美里市字美明 1491-27	2016	I	2021								
相生橋	市道昭和西1号線	1976	4.1	5	R C橋	美里市字美明 1491-41	2016	I	2021								
銀新橋	市道西2条道通・美明川線	1965	4.8	3.2	木橋	美里市字美明 1271-30	2016	I	2021								
藤橋	市道稲穂通	1986	4	7.5	P C橋	美里市字美明 1271-27	2016	I	2021								



構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	年度	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用	
								年度	判定区分						
あかしあ橋	市道あかしあ通	1989	10.6	17	P C橋	美里市字美明 1267-6	2014	II	2019	地覆 断面修復工ほか	2029	2029	21.3百万		
光珠内跨道橋	市道東2 2線	1986	44.8	4	P C橋	美里市字カーウ 2714659-52	2015	III	2020		2018	2018			
山の手跨道橋	市道南美明山の手線	1986	75.4	6.3	P C橋	美里市字美明 2660-14	2015	III	2020		2018	2018			
御道1号橋	市道御道2号線	1987	6	5	R C橋	美里市字峰延 原野3970-10	2017	I	2022						
峰延跨道橋	市道御道2号線	1987	52.2	5	P C橋	美里市字峰延 原野2433-3	2015	II	2020	主桁 断面修復工	2029	2029	0.7百万		
御道3号橋	市道御道3号線	1987	13.5	4	P C橋	美里市字峰延 原野4807-1	2017	I	2022						
旭町跨道橋	市道御道1 5号線	1987	46.1	5	P C橋	美里市字美明 2918-2	2015	III	2020						
藤岩橋	市道東8線	2007	15.6	7.5	R C橋	美里市字カノコ 1017-186	2016	I	2021						
御道5号橋	市道御道2 8号線	1988	8.8	4	R C橋	美里市字美明 1553-28	2017	I	2022						
御道6号橋	市道御道3 0号線	1988	8.8	4	R C橋	美里市字美明 1553-3	2017	I	2022						



構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用				
							年度	判定区分									
新生橋	市道新生北線	1989	4	8	P C橋	美里市字美里 1272-19	2016	I	2021								
4幹10号橋	市道西10号線	1988	8.4	7.5	P C橋	美里市字上美 里4066-1	2017	I	2022								
御道7号橋	市道奈美線	1988	6.4	4	R C橋	美里市字美里 里内1167-13	2017	I	2022								
川内7号橋	市道拓北・峰岸西7号線	1989	12.8	8.8	P C橋	美里市字上美 里4262-3	2017	I	2022								
2号橋	市道拓北・茶田内西4号線	1989	8.3	5.5	P C橋	美里市字茶志 内4456-6	2017	II	2022								
旧産化3号橋	市道西3号線	1991	5.8	7.5	P C橋	美里市字茶志 内2580-20	2016	I	2021								
6線1号橋	市道茶志内西1号線	1993	5.9	6	P C橋	美里市字茶志 内4803-5	2017	I	2022								
21線17号橋	市道西17号線	1995	11.6	7.5	P C橋	美里市字上美 里原野4825	2017	II	2022								
第2三日月橋	市道土桑町・水原西20号線	1994	10.5	5	P C橋	美里市字大雷 3920-2	2017	II	2022								
19線16号橋	市道西19号線	1994	9.4	6.5	P C橋	美里市字大雷 3369-6	2017	II	2022								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										備考		
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		事業費(百万円)	
新生橋	A	市道新生北線	4.0	1989	30	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
4幹10号橋	C	市道西10号線	9.4	1988	31	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
楽道7号橋	C	市道茅美南線	6.4	1988	31	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
川内7号橋	C	市道拓北・峠南西7号線	12.8	1989	30	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
2号橋	C	市道北沼・茶志内西4号線	8.3	1989	30	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
田原北3号橋	A	市道西3号線	5.8	1991	28	2016	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
6線1号橋	C	市道茶志内西1号線	5.9	1993	26	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
21線17号橋	C	市道西17号線	11.6	1995	24	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
第2三日月橋	C	市道上美町・大蔵西20線	10.5	1994	25	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											
19線16号橋	C	市道西19線	9.4	1994	25	2017	対策内容 事業費	【橋梁点検】											

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度					
							年度	判定区分									
上南橋	市道上美町西2.2線	1995	9.3	6	P C橋	美州市字上美 町原野2609	2017	I	2022				補修費用				
第2上南橋	市道上美町西2.2線	1995	9	7.5	P C橋	美州市字上美 町4165	2017	I	2022								
新川入道橋	市道中央団地南線	1968	14.4	1.5	鋼溶接橋	美州市西4条 北3丁目1252	2016	II	2021	支承モルタル打換工ほか	2029	2029	14.9百万				
上美町中央橋	市道上美町・大瀬西2.0線	1996	10.1	6	P C橋	美州市字上美町 原野2850-2	2017	I	2022								
上美町2.1線橋	市道西2.1線	1997	15.7	7.5	P C橋	美州市字美町 原野2450-1	2016	I	2021								
進徳西4号橋	市道進徳西4号線	1997	3.5	7.6	P C橋	美州市字美町 3602-52	2017	I	2022								
上美町1.3号橋	市道上美町西1.3号線	1996	9	6.8	P C橋	美州市字上美 町2237-1	2017	I	2022								
2.6線橋	市道東2.6線	2000	30	7.5	鋼溶接橋	美州市字かみかた 41870-2	2016	I	2021								
西6線橋	市道西6線	1998	20.4	5	P C橋	美州市字上美町 原野3615-1	2016	I	2021								
進徳1.9線橋	市道西1.9線	2000	11.4	5	P C橋	美州市字美町 1394-38	2017	I	2022								

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考								
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029										
上南橋	C	市道上美町西22線	9.3	1995	24	2017	対策内容 事業費																			
第2上南橋	C	市道上美町西22線	9.0	1995	24	2017	対策内容 事業費																			
新川入道橋	A	市道中央印地帯線	14.4	1998	51	2016	対策内容 事業費																			
上美町中央橋	C	市道上美町・大西西20線	10.1	1998	23	2017	対策内容 事業費																			
上美町21線橋	B	市道西21線	15.7	1997	22	2016	対策内容 事業費																			
道徳西4号橋	C	市道道徳西4号線	3.5	1997	22	2017	対策内容 事業費																			
上美町13号橋	C	市道上美町西13号線	9.0	1996	23	2017	対策内容 事業費																			
26線橋	B	市道東26線	30.0	2000	19	2016	対策内容 事業費																			
西6線橋	B	市道西6線	20.4	1998	21	2016	対策内容 事業費																			
進修19線橋	C	市道西19線	11.4	2000	19	2017	対策内容 事業費																			

構造物の諸元										直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容		対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用				
							年度	判定区分									
共栄橋	市道西19線	1993	13.5	7.5	P C橋	美瑛市字美瑛 1817-3	2017	I	2022								
三和橋	市道徳3区南1号線	1993	13.1	5	P C橋	美瑛市字美瑛 1393	2017	I	2022								
如月橋	市道徳1条北8・北9丁目線	2008	18.7	6	P C橋	美瑛市西2条北8 丁目1484-58	2016	I	2021								
日東春日台橋	市道東4線	2011	4.2	5	P C橋	美瑛市字オホツツ子 1020-165	2016	I	2021								
第2あかしあ橋	市道あかしあ通	1995	2.9	17.4	P C橋	美瑛市西4条北2 丁目1492-1	2016	I	2021								
銀座通橋	市道銀座通	1965	3	8.8	R C橋	美瑛市大通南1条南 4丁目1319-40	2016	I	2021								
コスモス橋	市道コスモス通	2002	30.1	8	H型橋	美瑛市東1条南1 丁目	2017	III	2022	2019	2019						

橋梁名	維持管理区分	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年度	最新点検年度	対象の内容・時期・事業費(百万円)										備考				
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		事業費(百万円)			
共栄橋	C	市道西19線	13.5	1993	26	2017	対策内容														
							事業費														
三和橋	C	市道通3区南1号線	13.1	1993	26	2017	対策内容														
							事業費														
知月橋	B	市道西1条北6-北9丁目線	18.7	2008	11	2016	対策内容														
							事業費														
日東春日台橋	A	市道東4線	4.2	2011	8	2016	対策内容														
							事業費														
第2あかし名橋	A	市道あかしあ通	2.9	1995	24	2016	対策内容														
							事業費														
船越通橋	A	市道船越通	3.0	1995	54	2016	対策内容														
							事業費														
コスエス橋	A	市道コスエス通	30.1	2002	17	2017	対策内容														
							事業費														
今後の修繕・架替え事業費(百万円)								95.8	56.9	175.3	148.2	133.8	121.8	58.7	25.3	70.9	146.7	1,033.4			

2019.4.6  
木心・橋修済み
